ソフトバンク株式会社 御中

ウルトラソフトバンクフェス
本格実施に向けたお打ち合わせ資料

テストイベントの振り返りと、本格実施の運営・条件のご確認

2026 年 10 月 22 日
株式会社円谷プロダクション
金額はすべて税別

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

本日の進め方

	内容	目安
1. テストイベントの振り返り	7 会場の実施結果と、本格実施に向けて改善したい点	10 分
2. 本格実施の役割分担	当日運営の分担、連絡体制、申請と確認書の流れ	20 分
3. ご提供条件	価格、最低開催数保証、ライン供給計画、実施条件	20 分
4. 今後の進め方	キャンペーン名称・ビジュアルの策定、契約手続き、スケジュール	10 分

本日決めていただきたいこと

本格実施の可否／役割分担／ 11 月末締結までの進め方／キャンペーン名称・ビジュアル策定打ち合わせの日程

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

1. テストイベントの振り返り

2026 年 9 〜 10 月、神奈川県内 7 会場 (写真撮影会 5 ・ステージショー 2)

実績

・ 7 会場 14 日間を予定どおり実施

・ステージショーは 1 回 150 〜 227 名。ヤマダ横浜で単日 227 名、古淵は開店前から 50 名の行列、整理券 200 枚が完売

・撮影会は 1 回の上限を 30 〜 35 組にすると安定。港南台は 2 日間とも滞りなく進行

・ヨドバシ横浜はノベルティの受け取りを店舗内にしたところ、見積の取得が増加

改善したい点

・ MC がいない会場で撮影ルールが伝わらず、場の盛り上がりが弱い

・スタッフの服装がまちまちでお客様から見分けがつかない。集合時間・接客にもばらつき

・撮影後の商談・アンケート案内が事前に伝わっておらず、不満の声

・監修前の POP 、非公式グッズ、 AI 生成画像の使用

・会場ごとの個別配送で物流が煩雑。 EDI の検収時期と書類発行のずれ

本格実施での運用ルール (案)

・公演は 1 日 4 回 (1 回 30 分、各 50 組まで) 。間に休憩とスーツメンテの時間を 1 時間半

・ MC 役を全会場に置く (ルール案内と進行アナウンス) 。スタッフ T シャツ着用、集合時間厳守、接客マナーの事前共有

・「商談・アンケートのご案内がある」ことを告知物と受付で明記

・制作物は監修済みの規定デザインのみ。他キャラクターとの混在不可。ノベルティは指定倉庫に一括納品、 5 営業日前に数量確定

・全会場の情報をまとめた告知ページを開設し、当社公式サイトから誘導。 EDI の検収と書類発行の時期を契約で整理

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

1. 会場別の実績

2026 年 9 月 12 日〜 10 月 18 日

会場	日程・形式	出演	動員	備考
イトーヨーカドー古淵	9/12-13 ショー	テオ & オメガ／ゼット & ジード	664 名 (各日 2 回)	開店前 50 名の行列、整理券 200 枚完売。抽選会の流れに混乱
イトーヨーカドー川崎	9/19-20 撮影会	ウルトラマン／オメガ	216 組 (各日 5 回)	監修前 POP と非公式品の装飾使用。店舗担当者が不在
ビックカメラ ラゾーナ川崎	9/19-20 撮影会	ゼロ／ティガ	225 組 (各日 3 回)	整理券 45 〜 50 枚 / 回がほぼ完売。景品に他 IP 品が混在
ヤマダデンキ横浜本店	9/26-27 ショー	テオ & オメガ／ゼット & ジード	622 名 (27 日は 227 名)	当日朝にレイアウト変更、ステージが屋外に
イトーヨーカドー上永谷	9/26-27 撮影会	ゼロ／ティガ	234 組 (各日 5 回)	初回の上限を 30 組にして人の偏りを解消
港南台バーズ	10/17-18 撮影会	ゼロ／ティガ	313 名 (各日 5 回)	上限 35 名 / 回。 2 日間とも滞りなく進行
ヨドバシカメラ横浜	10/17-18 撮影会	ゼロ／ティガ	344 名 (各日 5 回)	MC なしでルールが伝わらず。受け取りを店舗内に変更し見積取得増

会場に合わせた枠数 (30 〜 35 名 / 回) と事前の会場ブリーフィングで運営が安定する。 MC の配置と商談・アンケート案内の事前告知は全店共通にしたい

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

2. 本格実施の役割分担

当社はキャラクター稼働 (2 名) 、貴社は会場運営 (運営ディレクター 1 名 + 運営スタッフ 4 名)


役割	撮影会中	合間・開始前
当社 : 担当 (チーフスタッフ)	キャラクター稼働の統括。着脱補助、スーツメンテ、ヒーロー前のお客様対応	スーツメンテ。貴社ディレクターと進行確認
当社 : スーツアクター	キャラクター出演 (1 回 30 分、 1 日最大 5 回)	メンテ休憩
貴社 : 運営ディレクター	全体管理。音響の設置と音出し、館管理者との対応、周辺のお客様誘導	会場づくり、お客様対応
貴社 : スタッフ 1	待機列の先頭	会場づくり、整理券配布
貴社 : スタッフ 2	出口の送り出し	会場づくり、整理券配布
貴社 : スタッフ 3	撮影補助 (荷物運搬など)	会場づくり、列づくり
貴社 : スタッフ 4	待機列の最後尾 (参加者管理)	会場づくり、列づくり

・運営スタッフ 4 名は、撮影会中と合間で持ち場が入れ替わるために必要な人数です
・スタッフと分かる服装 (T シャツ・ベスト等) でお願いします。初回はレクチャーを当社が行い、運営マニュアルをお渡しします
・ MC 役は運営ディレクターの兼務、または当社の MC オプション (+3 万円 / 日) 。運営一式を当社で行うフル運営オプション (+22 万円 / 日) も会場単位で選べます

© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential

2. 連絡体制と回答日数

貴社の取りまとめ窓口と当社の総合窓口を 1 対 1 でつなぎ、当社内で用件ごとに振り分けます

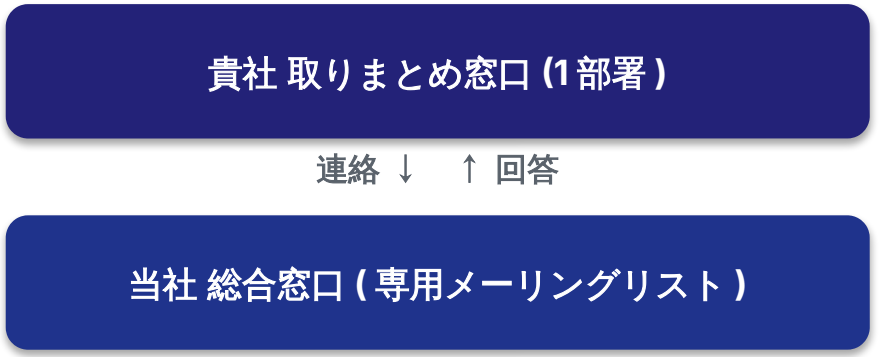

窓口	用件	回答日数
① イベント実施	開催申請 (エリア・会場・日程) のバッティング確認、実施確認書の確認	5 営業日。前月 1 日までに確定
② 告知物	KV ・ Web ・チラシ等の監修	KV 3 営業日、 Web 流用 1〜 2 営業日、チラシ + 色校 1〜 2 営業日
③ 制作物	仮申請 (制作可否) 、ノベルティ・キット等のデザイン監修	仮申請 約 5 営業日、デザイン監修 5 営業日
④ 契約・精算	発注、請求、最低保証の精算、実績報告	随時

当社側のメーリングリストは契約後にご案内します。開催当日の連絡は、会場の当社担当と貴社運営ディレクターの間で直接行います

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

2. 貴社にお願いしたいこと

区分	内容	テストでの対応
取りまとめ窓口	全国の実施を取りまとめる部署を 1 つ決め、各会場への展開と当社との連絡を一本化	新規
開催申請	専用フォームで申請、前月 1 日に可否確定、確認書を取り交わし。会場は 1 ヶ月前までに確定	新規
運営計画・実施確認書	会場ごとに貴社で作成。様式は当社のものをお渡しします	新規 (テストは当社作成)
制作物の仮申請	イベントキット・ノベルティ等を品目ごとに申請。備品か配布用かを明記。申請窓口は担当者 1 名	新規
運営サイン・音響・設営	会場内サイン、音響の手配と操作、イベントキットの設営と撤去	対応済
整理券・告知素材・実施報告	整理券と列づくりの備品、 HP 掲載用の文章と画像 (当社監修) 、参加人数の報告	対応済
会場要件ほか	施錠できる非公開の控室、関係車両の駐車場。 JASRAC 申請とイベント保険は主催者様で	対応済

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

3. ご提供価格 (ソフトバンク様特別価格)

年間契約と最低開催数保証を前提とした、本件限りの価格です

キャラクターイベント稼働費	通常販売価格	特別価格
1日 (1日最大 5 回公演)	225,000 円	100,000 円 (▲55.6%)
土日 2 日間	450,000 円	200,000 円
3 連休	675,000 円	300,000 円

特別価格の内訳 (1 日): キャラクター使用料 40,000 円、担当 35,000 円、スーツアクター 25,000 円
通常販売価格は同じ内容 (キャラクター使用料 + 担当 + アクター、 5 回公演対応) での当社標準価格

その他	金額
年間 IP 使用料	2,000 万円 / 年
作成許諾ロイヤリティ	作成費用の 20%
MC オプション	+30,000 円 / 日
フル運営オプション	+220,000 円 / 日
現場諸経費	20,000 円 / 日
実費	交通運搬・宿泊・スーツ送料 (基準料金表)

年間 IP 使用料に含まれるもの

店頭イベント・イベントキット・店頭訴求ツール・ LP/Web ・ SNS での IP 利用、作成物の監修、 8 ヒーローの選択と切替、キャラクター素材と運営マニュアルの提供

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

3. 実施の条件

特別価格の前提となる条件です。詳細は契約協議で調整します

#	条件	内容
1	**契約期間・締結**	2027 年 1 月〜 2029 年 3 月 (2 年 3 ヶ月) 。 2026 年 11 月末までに締結 (1 月開始に必要な体制準備のため)
2	**最低開催数保証**	基準 15 ライン分の開催数を保証。未実施の場合も当該数量分を申し受け、各年度末に精算
3	**開催確定とキャンセル**	会場・日程は開催 1 ヶ月前までに確定。確定後のキャンセル料は 1 ヶ月前〜 14 日前 30% 、 13 日前〜 7 日前 50% 、 6 日前〜当日 100%
4	**ライン供給**	基準 15 ライン。余裕のある月 (1 ・ 4 ・ 6 ・ 11 ・ 12 月) は最大 20 ラインまで (次頁)
5	**お支払い**	貴社 EDI で発注。 IP 使用料は年度前払い、保証分は四半期前払い (ご相談) 。最低保証契約のため、期間一括の発注形態をご相談したい
6	**エリア・キャラクター**	北関東エリアは 2027 年 1 〜 3 月は実施不可 (4 月以降は可) 。ウルトラセブンは対象外。出演は 8 ヒーロー
7	**排他条件**	契約期間中、当社は国内の他の携帯キャリア (3 社) と店頭イベントの契約を行わない

キャンセル料は 7 月ご提案時のスポット向け規定から、本契約向けの規定に変更しています

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

3. ライン供給計画 (2027 年 1 月〜 2029 年 3 月)

基準 15 ラインを最低保証の対象とし、余裕のある月は最大 20 ラインまで。月別の詳細は別紙

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
開催日数 (土日)	10	8	8	8	10	8	9	9	8	10	8	8
基準ライン数	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
最大ライン数	**20**	15	15	**20**	15	**20**	15	15	15	15	**20**	**20**

上表は 2027 年 (104 日) 。 2028 年は 106 日、 2029 年 1 〜 3 月は 25 日。ライン数の考え方は同じ

27 ヶ月合計	開催日数	開催数 (ライン × 日)	稼働費
基準 (15 ライン)	235 日	3,525 現場	**3 億 5,250 万円**
最大 (余裕月は 20 ライン)	235 日	4,005 現場	**4 億 50 万円**

・ 2 月・ 3 月・ 8 月・ 9 月は当社の主催行事と重なるため基準 15 ラインでの運用。増枠分は前月 1 日の開催確定時に確定
・上記は稼働費のみ。年間 IP 使用料、現場諸経費、実費は別途

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

3. エリア別のライン配分

基準 15 ラインのエリア配分と、余裕のある月の最大ライン数。月別の詳細は別紙

エリア	基準	余裕月の最大	27 ヶ月の現場数 (基準〜最大)	展開の考え方	主な出演候補
関東	6	**8**	1,410 〜 1,602	東京・神奈川・千葉を中心に通年固定	初代ウルトラマン、ティガ、ゼロ、テオ、オメガ、ゼット、ジード
関西	2	**3**	470 〜 566	大阪・兵庫・京都を中心に展開	ゼロ、ゼット、テオ、ジード、オメガ
東海	2	**3**	470 〜 566	愛知を中心に岐阜・三重・静岡	アーク、テオ、オメガ、ゼット、ジード
九州	2	**3**	470 〜 566	福岡を拠点に各県	ゼロ、ゼット、テオ、オメガ、ジード、ティガ
北海道	1	1	235	札幌近郊は日帰り、函館・釧路は宿泊	アーク、テオ、オメガ
東北・信越	1	1	235	仙台・新潟を拠点に交互に配分	初代ウルトラマン、テオ、オメガ、ジード
中国・四国・沖縄	1	1	235	広島・岡山を拠点に各県、沖縄は本島中心	アーク、テオ、オメガ、ジード、ゼロ、ゼット
合計	**15**	**20**	**3,525 〜 4,005**		

・エリア配分は目安。会場リストをいただいた段階で、バッティング基準 (半径 8km ・前後 8 日 /5 日) に照らして調整
・出演キャラクターは月別シフト表でご案内。北関東は 2027 年 1 〜 3 月は実施不可 (4 月以降は可)

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

4. 制作物と権利の進め方

キャンペーンビジュアルを決めてから、品目ごとに仮申請で制作物を確定していきます

キャンペーン名称・ KV の策定 (11 月中)

・ KV は貴社で制作 (当社で受託することも可能)

・撮影会の背景バナーは、キャラクターなしの背景素材 (青空・宇宙) を当社から提供

・会場装飾と告知物には集合ビジュアル (調整版) 、個体素材、ブランドロゴ

・監修は当社の制作物窓口へ。春節前の量産 (1 月末) から逆算し、 11 月中に確定

仮申請の流れ (別紙「仮申請のご案内」)

・貴社担当者 1 名を事前登録し、品目ごとに申請。約 1 週間で可否を回答

・入力項目は企画商品名 (「ノベルティ ○○」の表記) 、キャラクター、商品カテゴリー、製造原価単価、予定数量、材質・サイズなど

・配布物は商品カテゴリー 1 〜 16 、会場装飾は店舗備品として申請

・作成許諾ロイヤリティは作成費用の 20%(製造原価単価 × 数量)

ノベルティのカテゴリー

・制作できるもの : トートバッグ、タオル、 BOX ティッシュなど (キャンペーンデザイン使用)

・制作できないもの : お子様向け玩具 (フィギュア・ソフビ等) 、菓子類、ランチボックスなど

・タオルは一般的な仕様で (ループタオル・ミニタオルは避ける)

修了証・配布物

・既存の修了証は当社の別イベント用のため、本件では使わない

・案 A: 貴社のミッション (クイズ等) と連動したオリジナル修了証を貴社で制作

・案 B: キャンペーンビジュアルのステッカーを貴社で制作し、来場者全員に配布

・体験型か告知型か、配布の目的に合わせて選択

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential

4. スケジュール

2027 年 1 月開始からの逆算

時期	内容	担当
10 月 22 日 (本日)	本格実施の可否、役割分担の確定	両社
10 月下旬〜 11 月上旬	キャンペーン名称・ KV の策定打ち合わせ。契約書ドラフトの提示	両社／当社
11 月中	KV 確定、ノベルティ品目の仮申請、取りまとめ窓口の設置	貴社
11 月末	契約締結	両社
12 月	デザイン監修完了、量産開始 (春節前) 。 1 月開催分の会場確定 (12 月 1 日) 。運営レクチャー	両社
2027 年 1 月	開始 (基準 15 ライン。 1 月は最大 20 ライン)	両社

本日ご確認いただきたいこと

本格実施の可否／役割分担 (運営体制・取りまとめ窓口) ／ 11 月末締結までの進め方／ KV 策定打ち合わせの日程

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

Strictly Confidential
